113 年度 5 項完竣、 2 項未完竣，建議採方案甲續辦

本次陳請核定 114 年度續辦方案（方案甲／乙／丙三案擇一）；方案甲預算 420,000 元。

已完竣項目

5 項

母體： 7 項工程

經費執行率

92.7%

支用 1,724,000 元

整體滿意度

83.1%


母體：回收問卷 71 份

建議方案：採方案甲｜預算 420,000 元，補完 2 項未完竣項目

理由：問卷回饋以「側門坡道僅完成 1 處影響通行」（ 34 人次）與「活動中心前未劃設專用停車位」（ 27 人次）最多，續辦可同時回應使用者感受。

側門坡道與活動中心前停車位未完竣，其餘 5 項全數達成目標

母體： 7 項工程項目；各項達成率＝該項實績 ÷ 該項目標（單位不混算）

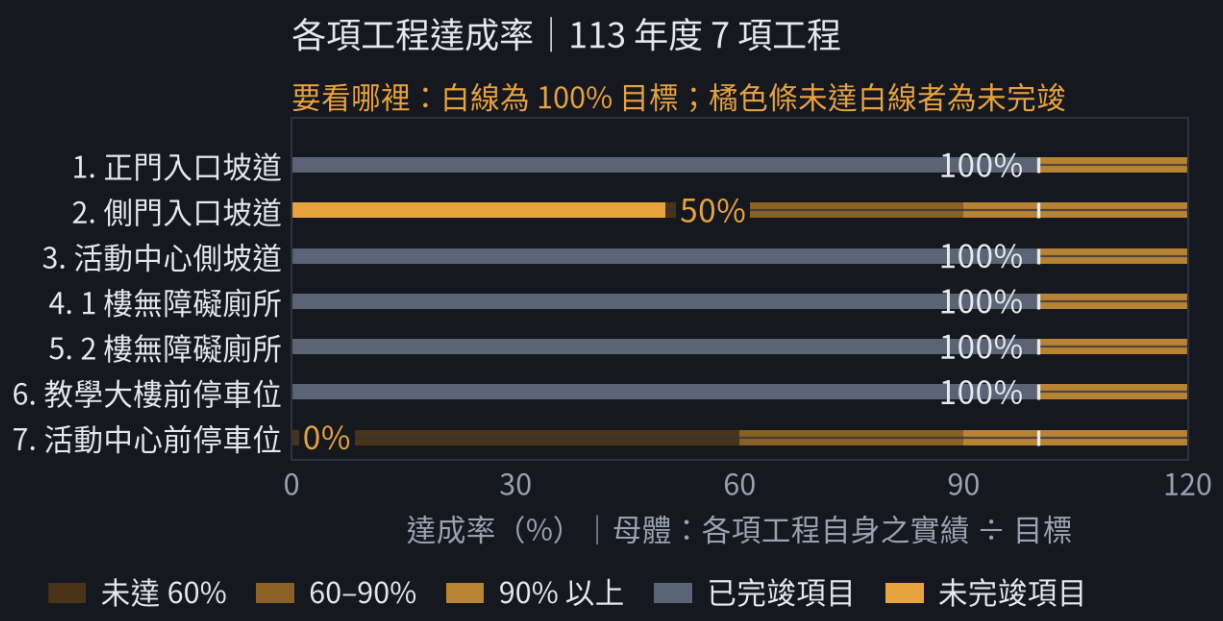

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）
口徑：各項工程自身之實績 ÷ 目標；處／間／席三種單位不合併計算｜示範素材

已完竣項目

5 項｜共 7 項

未完竣項目

2 項

各類設施達成率


坡道 83.3%｜廁所 100%｜停車位 66.7%

要看哪裡：白色直線為 100% 目標；橘色長條為未完竣項目，共 2 項。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

停車位動線滿意度最低（39 人），與未劃設專用停車位直接相關

母體：回收問卷 71 份（發出 86 份，回收率 82.6%）

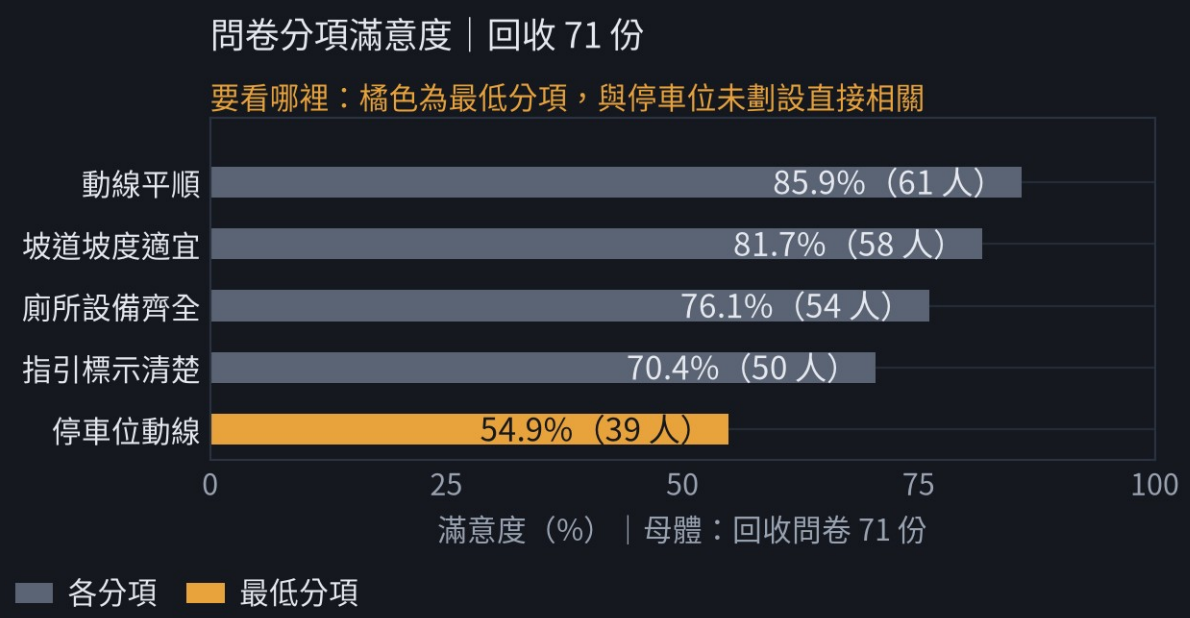

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）
整體滿意度 83.1%（59 人）；分母為回收 71 份｜示範素材

整體滿意度

83.1%｜59 人

最低分項｜停車位動線

39 人｜54.9%

開放回饋合計

100 人次｜複選

要看哪裡：橘色為最低分項「停車位動線」（39 人）；開放回饋以停車位未劃設最多。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

經費執行率 92.7%，坡道工程占實際支用 41.8%

母體：實際支用 1,724,000 元（核定 1,860,000 元）



資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）
母體：實際支用 1,724,000 元；執行率 92.7%｜示範素材

核定經費

1,860,000 元

實際支用

1,724,000 元｜執行率 92.7%

結餘（依規定繳回）


136,000 元

要看哪裡：坡道工程 720,000 元為最大支出項，但側門尚有 1 處未完竣。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

方案乙較甲多 160,000 元，多出來的是 3 處坡道照明

113 年度核定 1,860,000 元；三案擇一，方案丙不編列 114 年度經費

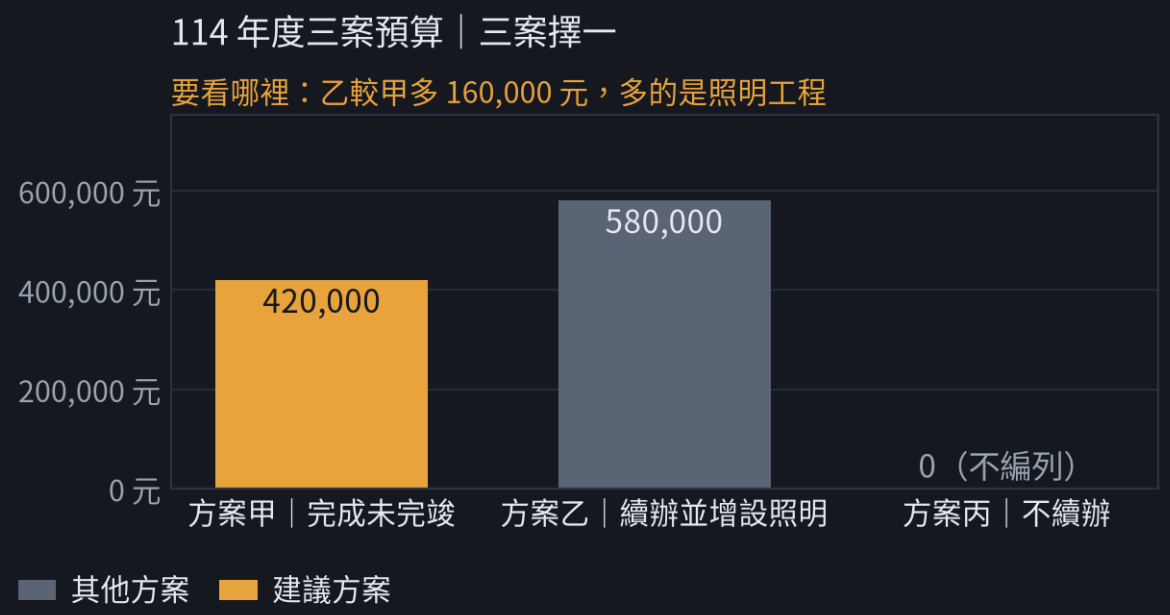

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）
方案甲 420,000 元、方案乙 580,000 元、方案丙 0 元｜示範素材

方案甲｜完成未完竣項目

420,000 元

方案乙｜續辦並增設照明

580,000 元

方案丙｜不續辦

0 元｜不編列

要看哪裡：方案甲 420,000 元、方案乙 580,000 元、方案丙 0 元；橘色為建議方案甲。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

三案後果：方案甲補完缺口，方案乙多綁一項照明前提

後果一律條件式；若未獲核定則 114 年度不編列經費

★ 建議｜方案甲｜完成未完竣項目

若核准則預算 420,000 元；側門坡道 1 處、活動中心前停車位 4 席全數補完。

時程： 114 年 6 月底前完竣、9 月開學前啟用。

方案乙｜續辦並增設照明

若核准則預算 580,000 元，較甲多 160,000 元；續辦項目須待照明驗收合格後方得啟用。

時程：照明須於 114 年 8 月底前驗收合格。

方案丙｜不續辦

若核准則 114 年度不編列經費；既有 5 項維持現況，活動中心前停車位持續為 0 席。

時程：無啟用時程變更。

建議採方案甲：預算 420,000 元，若核准則 2 項未完竣項目於 114 年 6 月底前完竣、 9 月開學前啟用。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

方案甲 420,000 元，分為兩項未完竣工程，完成後 7 項全數完竣

母體： 113 年度 7 項工程項目（已完竣 5 項、未完竣 2 項）

方案甲預算｜420,000 元

113 年度結餘 136,000 元依規定繳回

續辦項目｜2 項

側門坡道 1 處｜停車位 4 席

完竣後｜7 項全數

由 5 項增為 7 項

續辦工程明細｜合計 420,000 元

側門入口坡道 1 處： 280,000 元（原核定目標 2 處、已完竣 1 處，尚缺 1 處）

活動中心前專用停車位 4 席： 140,000 元（原核定目標 4 席、已完竣 0 席，尚缺 4 席）

要看哪裡：兩項續辦工程合計 420,000 元，與方案甲預算 420,000 元相同； 114 年度核定後 7 項將全數完竣。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材

請示：核定 114 年度無障礙設施改善續辦方案與經費

請指示採方案甲、乙或丙其中一案

請示事項①

核定 114 年度續辦方案

採方案甲／乙／丙其中一案；若未獲核定，則 114 年度不編列無障礙設施改善經費。

請示事項②

核定方案甲之續辦內容

側門入口坡道 1 處（280,000 元）、活動中心前專用停車位 4 席（140,000 元）。

請示事項③

確認停車位土地分區限制

活動中心前非法定停車場域，須先確認土地使用分區是否同意劃設；主責：教育局｜期限：114 年 2 月底前。

待確認事項｜主責：教育局

① 側門坡道地下管線遷徙協調｜期限：114 年 3 月底前；② 坡道夜間照明是否另案辦理｜期限：114 年 3 月底前

建議核定方案甲（420,000 元）；若未獲核定則 114 年度不編列經費。

資料來源：示範市政府教育局 113 年度校園無障礙設施改善工程執行成果報告（草稿）｜示範素材
